PJU/TRT18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM REDE PERT-CPM - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - REFORMA ANÁPOLIS

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% concl.	Custo	Trabalho
1		**Projetos Foro Anápolis**	**120 dias?**	**Seg 01/05/23**	**Seg 16/10/23**	**0%**	**R$ 153.627,28**	**1.048 hrs**
2		Ordem de serviço	0 dias	Seg 01/05/23	Seg 01/05/23	0%	R$ 0,00	0 hrs
3		**Supevisão e gerenciamento**	**120 dias**	**Seg 01/05/23**	**Seg 16/10/23**	**0%**	**R$ 31.960,96**	**208 hrs**
4		Coordenação de projetos BIM	6 meses	Seg 01/05/23	Seg 16/10/23	0%	R$ 7.438,56	48 hrs
5		Compatibilização de projetos BIM	6 meses	Seg 01/05/23	Seg 16/10/23	0%	R$ 18.596,40	120 hrs
6		Visitas técnicas	20 dias	Seg 01/05/23	Sex 26/05/23	0%	R$ 5.926,00	40 hrs
7		**Aprovações**	**84,5 dias**	**Seg 01/05/23**	**Sex 25/08/23**	**0%**	**R$ 13.030,26**	**0 hrs**
8		Emissão de ARTs	5 diasd	Seg 01/05/23	Sáb 06/05/23	0%	R$ 1.272,95	0 hrs
9		Obtenção de uso de solo, protocolo e aprovações do projeto prefeitura	20 diasd	Sex 05/05/23	Qui 25/05/23	0%	R$ 4.802,75	0 hrs
10		Licenciamento ambiental ou dispensa	30 diasd	Sex 05/05/23	Dom 04/06/23	0%	R$ 663,60	0 hrs
11		Liberação de carga e aprovação de projeto de entrada de energia junto à Equatorial	45 diasd	Sex 05/05/23	Seg 19/06/23	0%	R$ 3.667,52	0 hrs
12		Aprovação dos projetos de incêndio junto ao CBMGO	60 diasd	Seg 26/06/23	Sex 25/08/23	0%	R$ 2.623,44	0 hrs
13		Aprovação final pelo contratante (TRT)	0 dias	Qua 09/08/23	Qua 09/08/23	0%	R$ 0,00	0 hrs
14		**Projetos de arquitetura**	**33,25 dias**	**Seg 01/05/23**	**Qui 15/06/23**	**0%**	**R$ 31.419,18**	**234 hrs**
15		Legal	40 hrs	Seg 01/05/23	Sex 05/05/23	0%	R$ 5.370,80	40 hrs
16		Executivo	80 hrs	Sex 26/05/23	Qui 08/06/23	0%	R$ 10.741,60	80 hrs
17		Luminotécnico	10 hrs	Sex 26/05/23	Seg 29/05/23	0%	R$ 1.342,70	10 hrs
18		Paginações de pisos	16 hrs	Seg 29/05/23	Qua 31/05/23	0%	R$ 2.148,32	16 hrs
19		Esquadrias / caixilhos	8 hrs	Qua 31/05/23	Qui 01/06/23	0%	R$ 1.074,16	8 hrs
20		Acessibilidade	16 hrs	Qui 01/06/23	Seg 05/06/23	0%	R$ 2.148,32	16 hrs
21		Comunicação visual	24 hrs	Seg 05/06/23	Qui 08/06/23	0%	R$ 3.222,48	24 hrs
22		Paisagismo	16 hrs	Qui 08/06/23	Seg 12/06/23	0%	R$ 2.148,32	16 hrs
23		Memoriais técnicos	24 hrs	Seg 12/06/23	Qui 15/06/23	0%	R$ 3.222,48	24 hrs
24		**Projetos complementares**	**40,5 dias?**	**Seg 01/05/23**	**Seg 26/06/23**	**0%**	**R$ 72.837,78**	**488 hrs**
25		**Instalações elétricas e lógicas**	**14,5 dias**	**Seg 01/05/23**	**Sex 19/05/23**	**0%**	**R$ 31.009,24**	**212 hrs**
26		Entrada de energia	8 hrs	Qui 04/05/23	Qui 04/05/23	0%	R$ 1.170,16	8 hrs
27		Instalações de BT	80 hrs	Seg 01/05/23	Sex 12/05/23	0%	R$ 11.701,60	80 hrs
28		SPDA	16 hrs	Seg 01/05/23	Ter 02/05/23	0%	R$ 2.340,32	16 hrs
29		Cabeamento Estruturado	36 hrs	Qui 11/05/23	Qua 17/05/23	0%	R$ 5.265,72	36 hrs
30		Gerador estacionário	28 hrs	Seg 15/05/23	Qui 18/05/23	0%	R$ 4.095,56	28 hrs
31		Quadros elétricos	36 hrs	Seg 15/05/23	Sex 19/05/23	0%	R$ 5.265,72	36 hrs
32		Projeto de audio e video para salas de audiencia e espera	8 hrs	Seg 01/05/23	Seg 01/05/23	0%	R$ 1.170,16	8 hrs
33		**Projeto de Estruturas e Impermeabilizações**	**29 dias**	**Seg 08/05/23**	**Qui 15/06/23**	**0%**	**R$ 14.582,70**	**90 hrs**
34		Projeto estrutural completo com reforços	40 hrs	Seg 08/05/23	Sex 12/05/23	0%	R$ 6.481,20	40 hrs
35		Projeto de impermeabilização de terraço/lajes técnicas e floreiras	10 hrs	Sex 09/06/23	Seg 12/06/23	0%	R$ 1.620,30	10 hrs
36		**Instalações hidrossanitárias**	**5 dias**	**Sex 09/06/23**	**Qui 15/06/23**	**0%**	**R$ 6.481,20**	**40 hrs**
37		Esgoto e Aguas Pluviais	20 hrs	Sex 09/06/23	Ter 13/06/23	0%	R$ 3.240,60	20 hrs
38		Agua fria	20 hrs	Ter 13/06/23	Qui 15/06/23	0%	R$ 3.240,60	20 hrs
39		**Projetos de incêndio**	**11,5 dias**	**Sex 09/06/23**	**Seg 26/06/23**	**0%**	**R$ 11.936,04**	**76 hrs**
40		Projeto de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio	24 hrs	Sex 09/06/23	Ter 13/06/23	0%	R$ 3.510,48	24 hrs
41		Prevenção e combate a incêndio - PCI (hidrantes e extintores)	36 hrs	Sex 16/06/23	Qui 22/06/23	0%	R$ 5.833,08	36 hrs
42		Dimensiomaneto/projeto hidráulico de sistema de bombas/barrilete incêndio	16 hrs	Qui 22/06/23	Seg 26/06/23	0%	R$ 2.592,48	16 hrs
43		**Projetos de instalações mecânicas**	**13,75 dias?**	**Seg 08/05/23**	**Qui 25/05/23**	**0%**	**R$ 15.309,80**	**110 hrs**
44		Projeto de climatização, VRF	10 dias?	Seg 08/05/23	Sex 19/05/23	0%	R$ 11.134,40	80 hrs
45		Projeto de elevadores	3,75 dias?	Seg 22/05/23	Qui 25/05/23	0%	R$ 4.175,40	30 hrs
46		**Planejamento e orçamento**	**32,5 dias?**	**Seg 26/06/23**	**Qua 09/08/23**	**0%**	**R$ 4.379,10**	**118 hrs**
47		**Planilha orçamentária completa**	**10 dias?**	**Seg 26/06/23**	**Seg 10/07/23**	**0%**	**R$ 3.597,60**	**96 hrs**
48		Produção	2 dias?	Seg 26/06/23	Qua 28/06/23	0%	R$ 943,20	16 hrs
49		Apoio técnico	10 dias?	Seg 26/06/23	Seg 10/07/23	0%	R$ 2.654,40	80 hrs
50		**Cronograma físico financeiro**	**2,5 dias?**	**Seg 10/07/23**	**Qua 12/07/23**	**0%**	**R$ 781,50**	**22 hrs**
51		Produção	0,25 dias?	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	0%	R$ 117,90	2 hrs
52		Apoio técnico	2,5 dias?	Seg 10/07/23	Qua 12/07/23	0%	R$ 663,60	20 hrs
53		Revisões de orçamento	20 dias	Qui 13/07/23	Qua 09/08/23	0%	R$ 0,00	0 hrs
54		Aprovação final	0 dias	Qua 09/08/23	Qua 09/08/23	0%	R$ 0,00	0 hrs
55		Margem de segurança para atrasos	60 diasd	Qui 17/08/23	Seg 16/10/23	0%	R$ 0,00	0 hrs
56		Término previsto	0 dias	Seg 16/10/23	Seg 16/10/23	0%	R$ 0,00	0 hrs

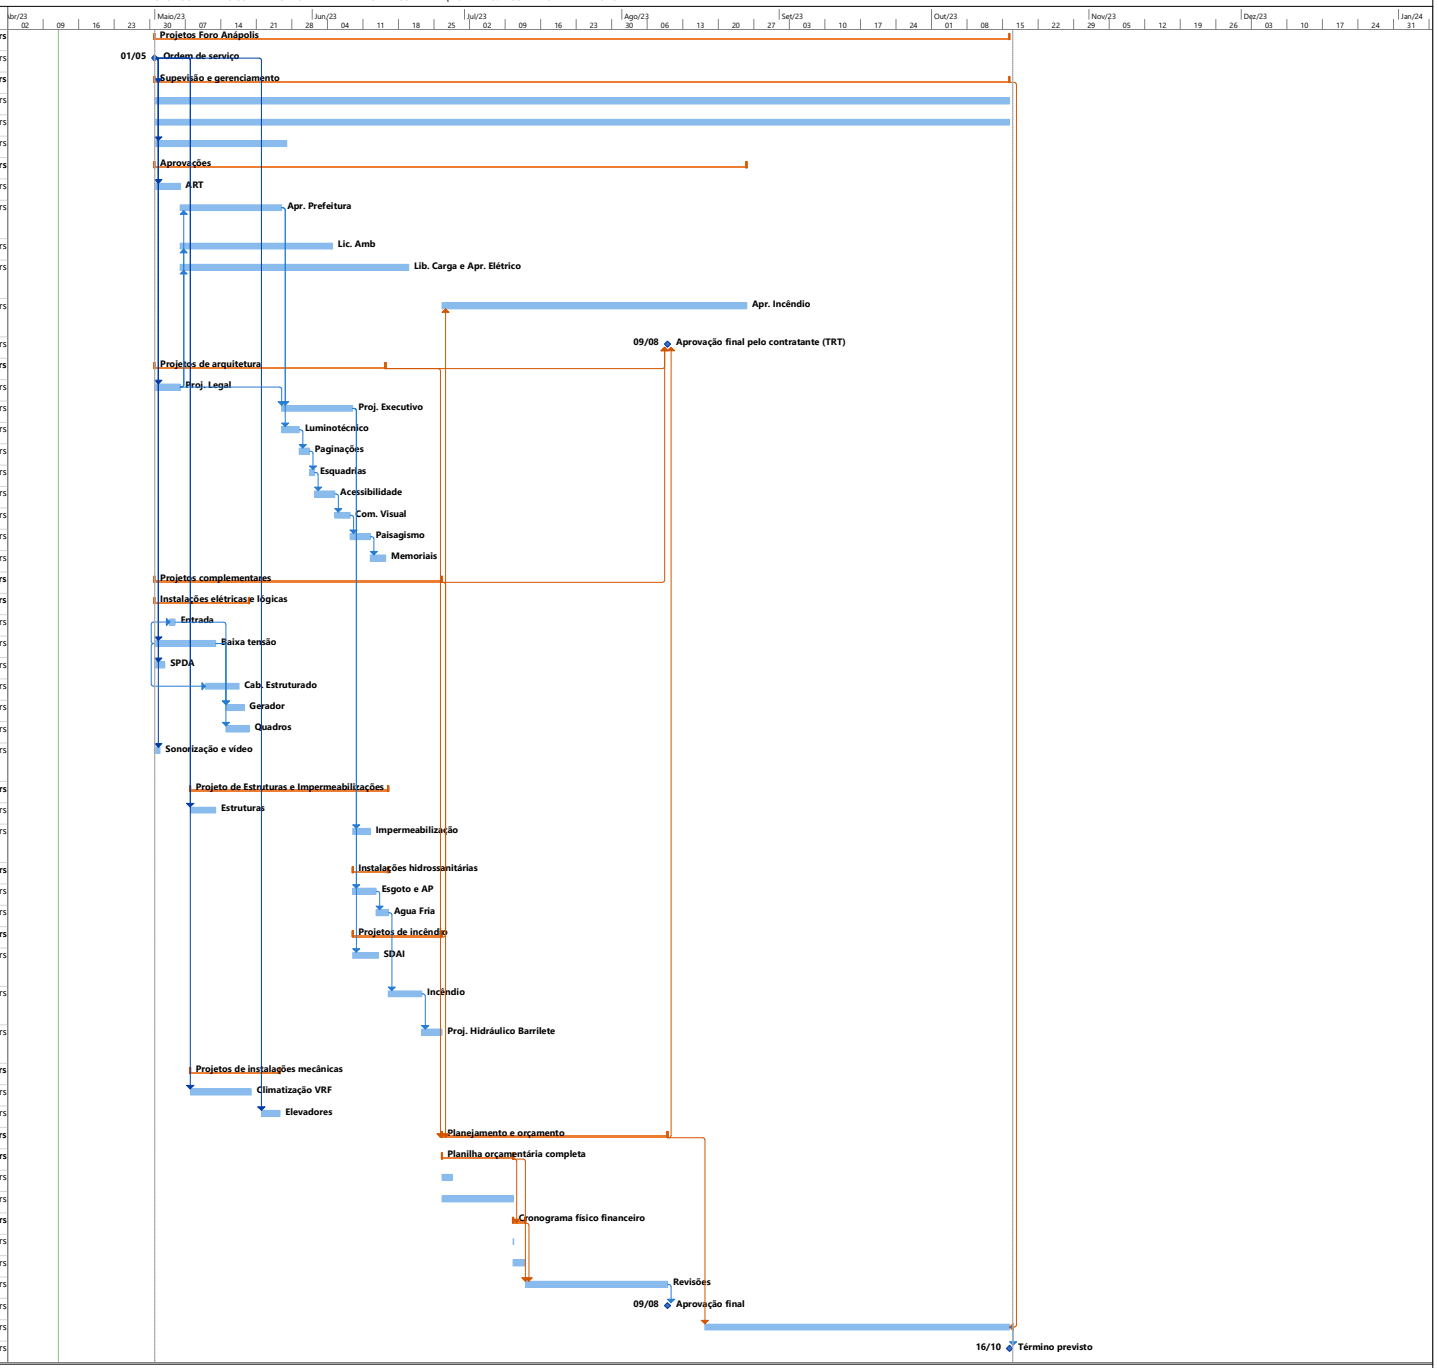

Projeto: Cronograma
Data: Qua 12/04/23

Tarefa · Divisão · Marco · Resumo · Resumo do projeto · Tarefa inativa · Marco inativo · Resumo inativo · Tarefa Manual · Somente duração · Acúmulo de Resumo Manual · Resumo Manual · Somente início · Somente término · Tarefas externas · Marco externo · Data limite · Andamento · Progresso manual

Cód. Autenticidade 400295913920

Documento juntado por REGINA CÉLIA DE MEDEIROS e protocolado em 29/05/2023 14:56:32h. Protocolo nº 1089/2023.
