Cronograma padrão.mpp

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início
1		**1**	**EXECUÇÃO DE PROJETOS - PADRÃO**	**133 dias**	**Seg 02/10/23**
2		1.1	Ordem de serviço	0 dias	Seg 02/10/23
3		**1.2**	**Supevisão e gerenciamento**	**120 dias**	**Seg 02/10/23**
4		1.2.1	Coordenação de projetos BIM	6 meses	Seg 02/10/23
5		1.2.2	Compatibilização de projetos BIM	6 meses	Seg 02/10/23
6		1.2.3	Visitas técnicas	5 diasd	Seg 02/10/23
7		**1.3**	**Aprovações**	**119 dias**	**Seg 02/10/23**
8		1.3.1	Emissão de ARTs	5 diasd	Seg 02/10/23
9		1.3.2	Obtenção de uso de solo, protocolo e aprovações do projeto prefeitura	30 diasd	Qua 01/11/23
10		1.3.3	Aprovação IPHAN, quando requerida	20 diasd	Seg 02/10/23
11		1.3.4	Licenciamento ambiental ou dispensa	30 diasd	Seg 02/10/23
12		1.3.5	Liberação de carga e aprovação de projeto de entrada de energia junto à Equatorial	60 diasd	Seg 02/10/23
13		1.3.6	Aprovação dos projetos de incêndio junto ao CBMGO	60 diasd	Seg 15/01/24
14		1.3.7	Aprovação final pelo contratante (TRT)	0 dias	Ter 05/03/24
15		**1.4**	**Projetos de arquitetura**	**69 dias**	**Seg 02/10/23**
16		1.4.1	PLE - Legal	30 diasd	Seg 02/10/23
17		1.4.2	PEX - Executivo	30 diasd	Sex 01/12/23
18		1.4.3	LUM - Luminotécnico	5 diasd	Sex 01/12/23
19		1.4.4	PAG - Paginações de pisos	5 diasd	Qua 01/11/23
20		1.4.5	ESQ - Esquadrias / caixilhos	5 diasd	Qua 01/11/23
21		1.4.6	ACB - Acessibilidade	5 diasd	Qua 01/11/23
22		1.4.7	CV - Comunicação visual	5 diasd	Qua 01/11/23
23		1.4.8	PAI - Paisagismo	5 diasd	Qua 01/11/23
24		1.4.9	ME - Memoriais técnicos	5 diasd	Dom 31/12/23
25		**1.5**	**Projetos complementares**	**75 dias**	**Seg 02/10/23**
26		**1.5.1**	**Complementares - Civil**	**47 dias**	**Qua 01/11/23**
27		1.5.1.1	FUN -Projeto de fundações	15 diasd	Sex 01/12/23
28		1.5.1.2	EST - Projeto de estruturas de concreto	30 diasd	Qua 01/11/23
29		1.5.1.3	IMP - Projeto de impermeabilizações	5 diasd	Dom 31/12/23
30		1.5.1.4	HID - Instalações hidrossanitárias completo	15 diasd	Qua 01/11/23
31		1.5.1.5	TER - Projeto de Terraplenagem	5 diasd	Qua 01/11/23
32		1.5.1.6	DRE - Projeto de Drenagem do Terreno	5 diasd	Qua 01/11/23
33		**1.5.2**	**Complementares - Elétrica**	**11 dias**	**Sex 01/12/23**
34		1.5.2.1	ELE.1 Entrada de energia	5 diasd	Seg 04/12/23
35		1.5.2.2	ELE.2 Instalações de BT	15 diasd	Sex 01/12/23
36		1.5.2.3	ELE.3 SPDA	5 diasd	Sex 01/12/23
37		1.5.2.4	ELE.4 Cabeamento Estruturado	5 diasd	Seg 11/12/23
38		1.5.2.5	ELE.5 Quadros elétricos	5 diasd	Sex 01/12/23
39		1.5.2.6	ELE.6 Projeto de audio e video para salas de audiencia e espera	5 diasd	Sex 01/12/23
40		1.5.2.7	ELE.7 Projeto fotovoltaico	5 diasd	Sex 01/12/23
41		**1.5.3**	**Complementares - Incêndio**	**75 dias**	**Seg 02/10/23**
42		1.5.3.1	PCI.SDAI - Projeto de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio	15 diasd	Dom 31/12/23
43		1.5.3.2	PCI.EXE - Prevenção e combate a incêndio - PCI (hidrantes e extintores)	15 diasd	Seg 02/10/23
44		1.5.3.3	PCI.HID - Dimensiomaneto/projeto hidráulico de sistema de bombas/barrilete incêndio	5 diasd	Ter 17/10/23
45		**1.5.4**	**Complementares - Mecânica**	**20 dias**	**Seg 02/10/23**
46		1.5.4.1	MEC.HVAC - Projeto de ar condicionado	20 diasd	Seg 09/10/23
47		1.5.4.2	MEC.TVP - Projeto de elevadores	5 diasd	Dom 22/10/23
48		1.5.4.3	MEC.GLP - Projeto GLP	5 diasd	Seg 02/10/23
49		**1.6**	**Planejamento e orçamento**	**36 dias**	**Seg 15/01/24**
50		**1.6.1**	**Planilha orçamentária completa**	**15 dias**	**Seg 15/01/24**
51		1.6.1.1	Produção	20 diasd	Seg 15/01/24
52		1.6.1.2	Apoio técnico	20 diasd	Seg 15/01/24
53		**1.6.2**	**Cronograma físico financeiro**	**15 dias**	**Dom 04/02/24**
54		1.6.2.1	Produção	20 diasd	Dom 04/02/24
55		1.6.2.2	Apoio técnico	20 diasd	Dom 04/02/24
56		1.6.3	Revisões de orçamento	10 diasd	Sáb 24/02/24
57		1.6.4	Aprovação final	0 dias	Ter 05/03/24
58		1.7	Margem de segurança para replanejamentos	30 diasd	Ter 05/03/24
59		1.8	Término previsto	0 dias	Qui 04/04/24

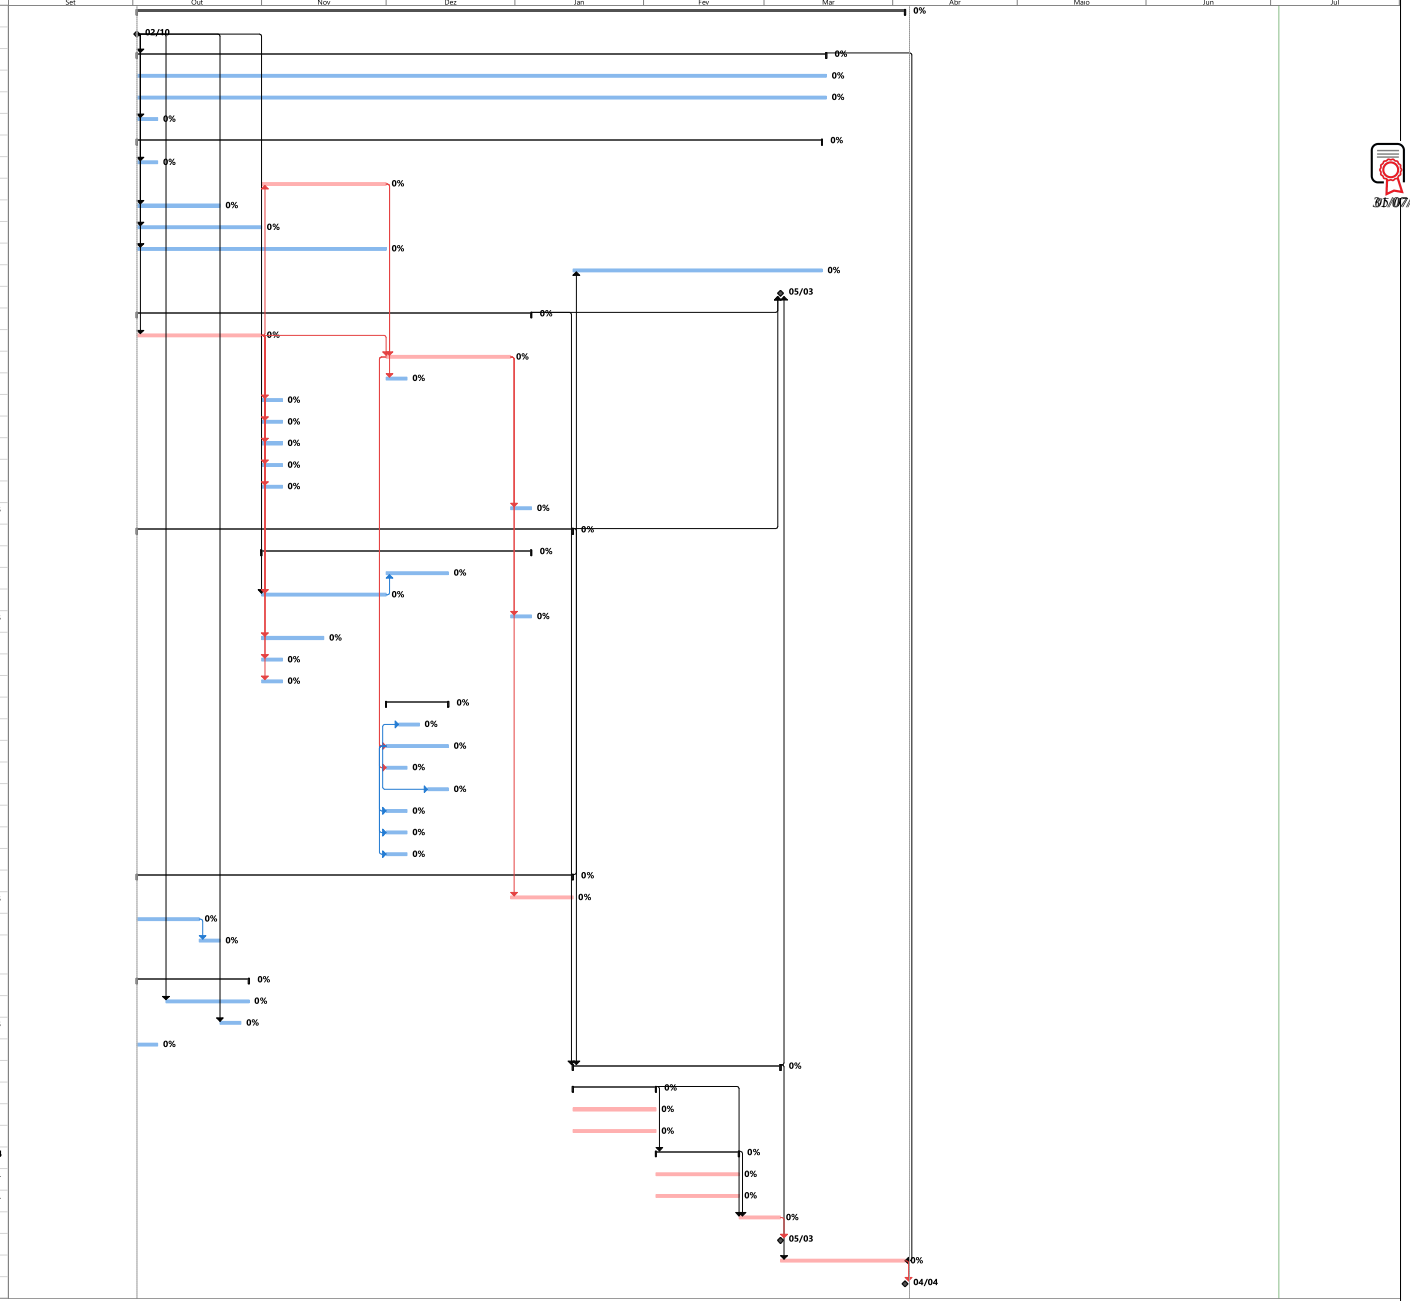

Crítica | Divisão Crítica | Andamento Crítico | Tarefa | Divisão | Andamento da Tarefa | Tarefa Manual | Somente início | Somente término | Somente duração | Linha de Base | Divisão da Linha de Base | Marco de Linha de Base | Marco | Andamento do Resumo | Resumo | Resumo Manual | Resumo do projeto | Tarefas externas | Marco externo | Tarefa Inativa | Marco Inativo | Resumo Inativo | Data limite

CÁSSIA REGINA GOMES DE MEDEIROS KAFURI
05/07/2024 12:38
