

Análise Estatística Descritiva para Estimativa de Custos de Manutenção Predial - TRT18

Fonte: dados históricos de manutenção (anexo A)

Mediana dos gastos históricos CT 27/2022

Prazo de referência: 24 meses

= R\$ 1.434,53

Terceiro quartil

= R\$ 6.701,82

Quantidade de demandas

= 363 chamados

Quantidade de meses

= 24 meses

Demandas por mês

= 15,125 chamados

Desvio padrão

= R\$ 21.761,70

Média

= R\$ 9.422,13

Curtose

= 22,26568088

Percebe-se que a amostra possui elevada curtose, representando uma cauda longa em relação a uma distribuição normal padrão (valor 3)

Distorção

= 4,236335363

Percebe-se que a amostra possui distorção elevada, representando grande quantidade de demandas de um lado da média em detrimento do outro. Não se assemelhando portanto a uma distribuição normal, que possuiria skewness igual a zero.

Quantidade de demandas abaixo da mediana

= 182 7,583333 por mês

Quantidade de demandas acima do 3º quartil

= 91 3,791667 por mês

Quantidade de demandas acima de 2 desvios padrão (5% dos dados - ocorrências excepcionais)

= 15 0,625 por mês

Da análise da estatística descritiva, depreende-se que os dados não apresentam similaridade com a distribuição normal ("tipo sino"), de forma que não é apropriado utilizar somente a média e a quantidade esperada de chamados. A proposta técnica de estimativa irá combinar a mediana, o terceiro quartil e o valor que divide 95% da amostra (representando serviços excepcionais).

Além disso, constata-se que se a amostra por valores de chamados já não acompanha uma distribuição normal, a tarefa de classificar os serviços SINAPI dentro de cada ordem de serviços pouco acrescentaria ao poder de previsão do eventual modelo, tendo em vista a característica observada da distribuição: não há uma distribuição concentrada em torno da medida de tendência central, razão pela qual se espera que a listagem de serviços mais frequentes conduziria a uma inerente imprecisão na previsão de suas quantidades.

Histograma dos serviços de manutenção predial (ct 27/2022)

Máximo187061


Mínimo21,62

Qtd15

Estratos

Intervalo12469,29

Estrato	Inicio	Fim	Media	Quantidade	Freq
1	21,62	12490,91	6256,267	299	0,823691
2	12490,91	24960,21	18725,56	26	0,071625
3	24960,21	37429,5	31194,86	12	0,033058
4	37429,5	49898,8	43664,15	6	0,016529
5	49898,8	62368,09	56133,45	6	0,016529
6	62368,09	74837,39	68602,74	5	0,013774
7	74837,39	87306,68	81072,04	3	0,008264
8	87306,68	99775,98	93541,33	1	0,002755
9	99775,98	112245,3	106010,6	0	0
10	112245,3	124714,6	118479,9	2	0,00551
11	124714,6	137183,9	130949,2	1	0,002755
12	137183,9	149653,2	143418,5	1	0,002755
13	149653,2	162122,5	155887,8	0	0
14	162122,5	174591,7	168357,1	0	0
15	174591,7	187061	180826,4	1	0,002755

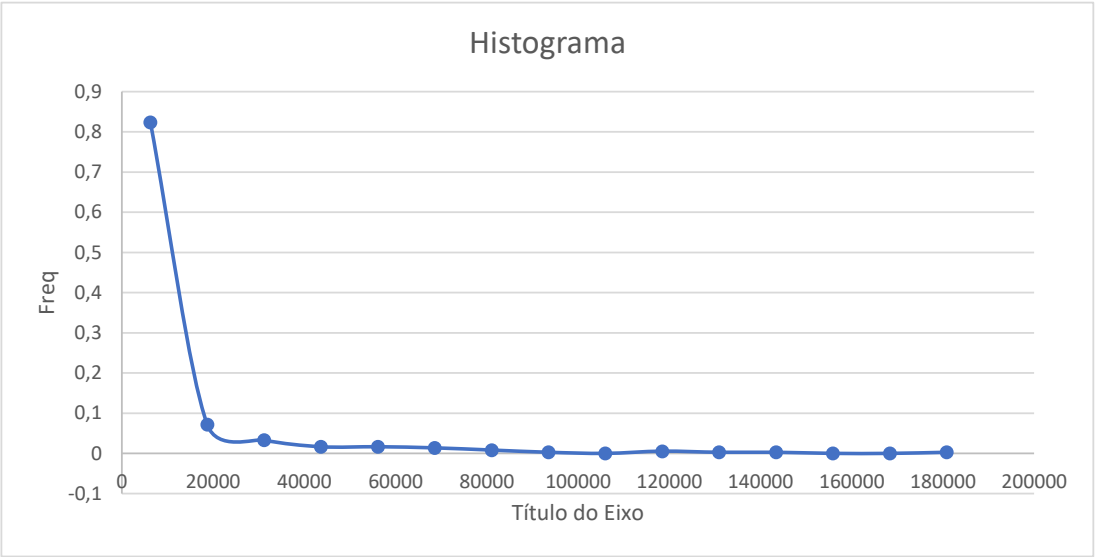

* até set. 2024
* engloba 24 meses de contrato

Memória de Cálculo do Custo Mensal com Demandas

Composição da estimativa mensal

	Quantidade mensal	Valor estimado	Subtotal Mensal
Demandas padrão (mediana)	7,5833	R\$ 1.434,53	R\$ 10.878,52
Demandas atípicas (3º quartil)	3,7917	R\$ 6.701,82	R\$ 25.411,07
* Demandas excepcionais (2º desvio padrão)	0,6250	R\$ 120.003,29	R\$ 75.002,05
	Total mensal:		R\$ 111.291,64

Para valor das demandas excepcionais, considerou-se o ponto médio entre o máximo histórico e o valor situado a 2 desvios padrão em relação a média, com intuito minimizar subestimativa relevante, tendo em vista que embora tenha havido menos de 1 serviço/mes neste estrato, o valor do mais caro representou cerca de 3 vezes o custo base do critério (2 desvios).

Estimativa preliminar anual	R\$ 1.335.499,68
-----------------------------	------------------

Tendo em vista que a contagem por estratos conduziu a 12 chamados por mês, porém a amostra como um todo representa a média de 15 chamados por mês, deve-se fazer um ajuste de 25% no valor obtido. Destaca-se que não foi interpolado (e contado) o intervalo entre a mediana e o terceiro quartil, acreditando-se que seja negligenciável tendo em vista a curtose da amostra e a forma que foi estimado o valor do ultimo estrato (ponto médio).
Por fim, reputa-se prudente a previsão de uma contingência de 5% para eventualidades, razão pela qual o valor estimado acima será acrescido em 30%.

Estimativa final anual	R\$ 1.736.149,58
------------------------	------------------

Anexo A - Dados histórico de manutenções registradas no sistema GLPI para o contrato 27/2022 (manutenção predial) vigente

ID	Título	Data_Aber	Data_Sol	Custo_Total	Custo - Custo de material	Custo - Custo fixo
221485	CTG - Área externa - pintura de lixeira (rua T-52).	13/09/2022 15:40	29/09/2022 13:58	R\$ 386,17	R\$ 168,87	R\$ 207,30
221502	VARA DO TRABALHO DE GOIÁS - TERREO - POR TODA A VT - Serviços corretivos de maior porte	13/09/2022 17:08	31/12/2022 13:52	R\$ 56.095,58	R\$ 38.068,60	R\$ 17.986,98
221504	CTG - TERREO - CENTRO DE MEMÓRIA - Instalação de painel de linha do tempo	13/09/2022 17:13	31/10/2022 13:53	R\$ 3.726,61	R\$ 2.978,90	R\$ 744,71
221591	FTG - 1º ANDAR - ANTIGA COPA DA STI - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA	14/09/2022 14:55	08/02/2023 08:20	R\$ 1.246,40	R\$ 933,15	R\$ 303,25
221627	CTG - 1º SUBSOLO - ÁREA VIP - LOUNGE, DO AUDITÓRIO GOYAZES - Manutenção em Portas de Vidro da Área Vip - Lounge, de	15/09/2022 09:17	13/01/2023 13:58	R\$ 1.235,84	R\$ 479,26	R\$ 741,58
221672	IALBA- SUBSOLO - ALMOXARIFADO - Substituição de divisórias, conforme PA 9772/2022	15/09/2022 12:15	15/02/2023 17:27	R\$ 1.161,08	R\$ 612,25	R\$ 518,83
221869	CTG - Térreo - Praça - Instalar barra antipânico na rota de fuga.	19/09/2022 12:47	13/01/2023 14:07	R\$ 2.465,98	R\$ 1.639,72	R\$ 816,26
221889	FTG - Revisar e reparar as portas de vidro dos locais abaixo indicados.	19/09/2022 15:00	31/01/2023 16:07	R\$ 7.780,20	R\$ 7.780,20	R\$ 30,00
222462	CTG - 1º SUBSOLO - DIVISÃO DE SAÚDE - Reparar furo em piso vinílico e trincas em paredes no setor odontológico	27/09/2022 10:20	13/01/2023 14:09	R\$ 1.701,12	R\$ 1.043,82	R\$ 645,30
222465	FTG - 1º ANDAR - OUVIDORIA - Alteração de layout	27/09/2022 10:27	28/02/2023 15:38	R\$ 30.752,77	R\$ 22.523,94	R\$ 8.168,83
222467	FTG - 2º ANDAR - SALA DA OAB - transformação da antiga sala da oab em espera do cejusc	27/09/2022 10:44	31/01/2023 22:05	R\$ 34.530,71	R\$ 28.726,48	R\$ 5.764,23
222471	CTG - 1º SUBSOLO - DIVISÃO DE SAÚDE - Instalação acústica em consultórios de psicologia	27/09/2022 10:49	13/01/2023 14:10	R\$ 11.163,43	R\$ 9.890,57	R\$ 1.257,86
222486	CTG - TERREO - ÁREA COMUM - Substituição de vidro temperado na fachada externa da CEF	27/09/2022 11:18	02/12/2022 11:01	R\$ 4.025,33	R\$ 3.808,96	R\$ 201,37
222487	CTG - TERREO - ÁREA COMUM - Regulagem de porta de vidro ("garrando")	27/09/2022 11:22	13/01/2023 14:11	R\$ 623,16	R\$ 176,96	R\$ 426,20
222489	IALBA- SUBSOLO - ALMOXARIFADO - Instalar películas na sala da administração do almoxarifado	27/09/2022 11:24	13/01/2023 14:14	R\$ 519,66	R\$ 472,20	R\$ 37,46
222495	FTG - TERREO - LANCHONETE - Instalação de exaustor	27/09/2022 11:40	13/01/2023 14:16	R\$ 4.472,62	R\$ 3.297,75	R\$ 1.154,87
222497	FTG - 1º ANDAR - ESPAÇO CONGADAS - Refazer vedação, com silicone, nos vidros da fachada	27/09/2022 11:45	13/01/2023 14:20	R\$ 1.518,47	R\$ 1.518,47	R\$ 20,00
222510	FÓRUM DE APARECIDA DE GOIANIA - TERREO - ESTACIONAMENTO - Motor do portão não está funcionando	27/09/2022 12:40	24/11/2022 13:02	R\$ 2.953,48	R\$ 2.904,46	R\$ 44,02
222641	IALBA - ESTACIONAMENTO - ÁREA EXTERNA - Providenciar fechamento de vão abaixo da rampa de pessoas com deficiência -	28/09/2022 14:42	01/02/2023 16:25	R\$ 5.857,93	R\$ 4.080,48	R\$ 1.757,45
222649	CTG - 3º andar - Gabinete Desor. Gentil - providenciar a instalação de cooktop de indução.	28/09/2022 15:14	03/02/2023 16:50	R\$ 268,11	-	R\$ 268,11
222654	FTG/CTG - SUBSOLO - ESTACIONAMENTO - Retirar entulho	28/09/2022 15:31	24/11/2022 13:08	R\$ 1.907,41	R\$ 1.601,47	R\$ 275,94
222810	CTG - 3º ANDAR - CSIN (COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMACAO) - Alteração de layout	30/09/2022 14:30	28/02/2023 22:31	R\$ 24.516,81	R\$ 16.783,64	R\$ 7.673,17
222819	FTG - 01º ANDAR - AUDITÓRIO ILUMIA BOA - Instalação de película na cor fumê no local indicado pela Divisão de Engenharia CI	30/09/2022 15:16	13/01/2023 14:28	R\$ 324,17	R\$ 294,57	R\$ 19,60
223367	CTG - 2º SS - GERENCIA DE GESTAO DOCUMENTAL - Alteração de layout	07/10/2022 12:19	13/01/2023 14:35	R\$ 6.197,51	R\$ 5.190,43	R\$ 977,08
223511	VT Goiâniaésia - substituir calha do telhado.	10/10/2022 14:50	16/01/2023 12:56	R\$ 20.876,21	R\$ 13.869,27	R\$ 6.991,94
224177	VARA DO TRABALHO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - TERREO - Serviços corretivos de maior porte	10/10/2022 14:49	28/02/2023 22:29	R\$ 115.411,63	R\$ 91.560,01	R\$ 23.776,62
224179	FÓRUM DE ITUMBIARA - TERREO - Serviços corretivos de maior porte.	19/10/2022 14:52	R\$ 187.061,04	R\$ 155.921,29	R\$ 31.079,75	
225066	CTG - 2º SS - SALA DE MONITORAMENTO - Persiana solta	03/11/2022 10:18	13/01/2023 14:36	R\$ 385,79	R\$ 246,82	R\$ 118,97
225160	FTG - 3º ANDAR - SECAO DE ATERMACAO - Pintura de parede.	03/11/2022 15:07	28/11/2022 10:31	R\$ 780,44	R\$ 534,40	R\$ 234,04
225494	VT CERES - COBERTURA - Serviços diversos.	08/11/2022 16:54	31/03/2023 11:02	R\$ 21.681,50	R\$ 13.306,73	R\$ 8.312,77
225495	VT SAO LUIS DE MONTES BELOS - COBERTURA - substituir calha do telhado.	08/11/2022 16:55	31/01/2024 16:13	R\$ 23.213,29	R\$ 16.668,73	R\$ 6.544,57
225612	FTG - TERREO (LADO T-51) - Impermeabilizar a canaleta de concreto da entrada do prédio - Armando	10/11/2022 10:47	18/01/2023 18:56	R\$ 535,46	R\$ 520,46	R\$ 14,00
225662	CTG - 2º SUBSOLO - ASIUSTEGO - reparar reboco da área externa. URGENTE	10/11/2022 15:09	28/02/2023 22:45	R\$ 878,51	R\$ 628,80	R\$ 248,71
225773	CTG - 3º ANDAR - BL APOIO - CEJUSC DIGITAL (sala 113) - Substituição das divisórias acústicas da sala	11/11/2022 16:32	28/02/2023 22:27	R\$ 23.613,01	R\$ 15.581,65	R\$ 7.971,36
225895	CTG - 2º SS - ASIUSTEGO - Vazamento no teto.	16/11/2022 14:30	13/01/2023 14:36	R\$ 508,10	R\$ 341,68	R\$ 146,42
225996	CTG - 3º ANDAR - ATERMACAO - Instalar cortina faltante na Atermação - Armando	17/11/2022 11:24	13/01/2023 14:37	R\$ 2.363,83	R\$ 739,04	R\$ 1.621,79
226070	CTG - 1º SS - NUCLEO DE SAÚDE - Instalar rufo embaixo da grelha externa para conter vazamento no pavimento inferior.	17/11/2022 16:13	13/01/2023 14:42	R\$ 1.555,33	R\$ 1.322,49	R\$ 222,84
226156	FTG - 1º andar - Espaço Congadas - Reparar furo de gesso no pé direito triplô.	18/11/2022 12:17	13/01/2023 14:43	R\$ 843,92	R\$ 668,03	R\$ 155,89
226272	FÓRO DE APARECIDA DE GOIANIA - TERREO - Reparo em bomba de incêndio e correção de vazamento em tubulação de incêr	21/11/2022 11:08	29/09/2023 15:22	R\$ 7.921,03	R\$ 1.938,60	R\$ 5.962,43
226305	VARA DO TRABALHO DE POSSE - TERREO - POR TODA A VT - Serviços corretivos gerais.	21/11/2022 13:05	31/05/2024 13:58	R\$ 60.970,25	R\$ 42.526,35	R\$ 18.443,90
226331	CTG - 1º SUBSOLO/2º SUBSOLO/5º PAV - ÁREA COMUM - Recomposição de forro de gesso.	21/11/2022 14:35	13/01/2023 14:44	R\$ 620,07	R\$ 407,37	R\$ 164,70
226458	FTG - 9º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - Sala de aula, lado T-29. Verificar vazamento em teto.	22/11/2022 14:03	01/02/2023 15:45	R\$ 722,33	R\$ 295,24	R\$ 420,09
226460	FTG - 5º ANDAR - 12ª VT - Sala de Audiências - Esquadria de vidro não fecha.	22/11/2022 14:05	13/01/2023 14:45	R\$ 113,04	R\$ 67,28	R\$ 25,76
226479	VARA DO TRABALHO DE MINEIROS - TERREO - ÁREA COMUM - Instalação de concertina e cerca elétrica em muros e grades d	22/11/2022 15:14	13/01/2023 16:00	R\$ 15.088,25	R\$ 10.697,31	R\$ 4.370,94
226628	FTG - 1º ANDAR - BIBLIOTECA - Fixar porta de vidro na entrada da biblioteca	24/11/2022 07:32	13/01/2023 14:45	R\$ 262,87	R\$ 159,90	R\$ 82,97
226731	FÓRUM DE APARECIDA DE GOIANIA - TERREO - Serviços diversos.	24/11/2022 12:32	23/06/2023 12:01	R\$ 18.933,38	R\$ 10.773,21	R\$ 8.130,17
226755	FTG - TODOS OS PAVIMENTOS - ÁREA COMUM - Desfazer / Desconectar sistema de automação do Fórum e interligar novame	24/11/2022 13:48	27/03/2023 22:50	R\$ 913,39	R\$ 741,03	R\$ 142,36
226848	VT LUZIANIA - Instalar concertina.	25/11/2022 11:43	16/01/2023 16:51	R\$ 12.953,81	R\$ 10.047,26	R\$ 2.891,55
226867	FÓRO DE ITUMBIARA - Instalar concertina - URGENTE.	25/11/2022 12:53	02/01/2023 11:12	R\$ 10.480,15	R\$ 8.139,70	R\$ 2.325,45
226964	CTG - 04º SUBSOLO - Verificar o funcionamento das bombas do 4º subsolo	28/11/2022 10:02	23/01/2023 08:04	R\$ 2.757,47	R\$ 1.785,41	R\$ 957,06
226987	VT DE GOIÁS - TERREO - POR TODA A VT - Serviços de pintura e troca de piso.	28/11/2022 12:04	30/06/2023 17:53	R\$ 43.695,04	R\$ 27.883,14	R\$ 15.751,90
227233	FTG - 8º PAVIMENTO - STIC - Recorpar forros de gesso e acessórios danificados pelo vazamento ocorrido no 8º pavimento (v	30/11/2022 11:52	13/01/2023 14:51	R\$ 856,47	R\$ 666,25	R\$ 170,22
227244	VT INHUMAS - TERREO - Reparar na porta de vidro da entrada principal e outros serviços.	30/11/2022 12:23	18/05/2023 18:56	R\$ 1.434,53	R\$ 1.230,67	R\$ 193,86
227251	VT URUAÇU - TERREO - Substituição da estrutura da porta de vidro e vidros do fechamento do perímetro da porta giratória d	30/11/2022 12:41	17/03/2023 09:22	R\$ 4.936,59	R\$ 3.455,58	R\$ 1.461,01
228044	FTG - 1º ANDAR - Copa - Instalação de pia de cozinha na Copa de apoio aos eventos.	08/12/2022 14:58	31/01/2023 14:25	R\$ 3.007,63	R\$ 2.481,34	R\$ 525,29
228232	VT DE POSSE - TERREO - Instalação de concertina.	13/12/2022 10:43	16/01/2023 12:56	R\$ 5.504,59	R\$ 4.171,14	R\$ 1.313,45
228270	VT VALPARAISO - COBERTURA - Corrigir vazamento decorrente da cobertura.	13/12/2022 14:39	30/04/2023 14:33	R\$ 13.371,09	R\$ 9.076,00	R\$ 4.255,09
228593	POSTO AVANÇADO DE PORANGATU - COBERTURA - Vazamento de água decorrente da cobertura. URGENTE	16/12/2022 10:49	R\$ 30.193,74	R\$ 20.032,69	R\$ 10.121,05	
228716	FTG - 02º ANDAR - SALA DO PROJETO - Providenciar vedação na abertura do vidro do retroprojeto	19/12/2022 11:23	31/01/2023 14:24	R\$ 1.334,18	R\$ 1.039,03	R\$ 275,15
228717	FTG - 02º ANDAR - SAGUÃO DE ENTRADA - Substituir vidro quebrado na fachada.	19/12/2022 11:26	08/02/2023 08:18	R\$ 5.951,94	R\$ 4.989,90	R\$ 942,04
228726	FTG - 08º ANDAR - SECRETARIA-GERAL JUDICIARIA - Reparar exaustor (não funciona).	19/12/2022 12:01	22/03/2023 18:16	R\$ 2.938,55	R\$ 1.466,27	R\$ 1.442,28
228844	FTG - TERREO - ENTRADA DO ESTACIONAMENTO - Substituir cabo da cancela que está parcialmente rompido.	22/12/2022 10:36	04/01/2023 12:21	R\$ 143,31	R\$ 143,31	R\$ 5,00
228872	FTG - 08º ANDAR - STIC - Recorpar parede de drywall que foi aberta para solucionar vazamento.	26/12/2022 09:36	23/02/2023 09:48	R\$ 106,53	R\$ 72,42	R\$ 19,11
228920	CTG - 01º SUBSOLO - SETOR ODONTOLÓGICO - Fornecimento e instalação de vidro temperado com película de segurança no	30/12/2022 12:00	23/01/2023 08:04	R\$ 95,01	R\$ 83,49	R\$ 3,48
228922	CTG - 2º SUBSOLO - Reparar forro e pintura em frente a sala de negociação (4º pav) e saída estacionamento (2º SS).	30/12/2022 12:00	08/01/2023 18:10	R\$ 271,67	R\$ 181,69	R\$ 69,98
228948	FTG - 09º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - SALA FORMACAO DE MAGISTRADOS - Verificar e corrigir vazamento no teto.	04/01/2023 10:36	31/05/2023 14:46	R\$ 178,90	R\$ 142,75	R\$ 34,15
228968	FTG - 08º ANDAR - SECRETARIA GERAL JUDICIARIA - Reparar trincas na parede do banheiro privativo do secretário e janela na	05/01/2023 15:30	27/06/2023 13:39	R\$ 336,51	R\$ 233,97	R\$ 87,54
228969	CTG - 01º SUBSOLO - HALL DOS PLENÁRIOS - Recorpar o forro de gesso e a pintura na divisa do CTG e FTG.	05/01/2023 15:30	31/01/2023 14:26	R\$ 260,70	R\$ 173,66	R\$ 72,04
228981	FTG - 09º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - Correção de infiltração dentro do banheiro privativo.	06/01/2023 16:00	23/06/2023 12:16	R\$ 202,48	R\$ 160,21	R\$ 40,27
229205	FTG/CTG - SUBSOLO/COBERTURA - Retirar entulho	10/01/2023 15:20	16/01/2023 13:27	R\$ 484,62	R\$ 484,62	R\$ 1,00
229273	VARA DO TRABALHO DE GOIANÉSIA - N/A - Emitir ART de manutenção do sistema de gás canalizado, por engenheiro mecânico, co	11/01/2023 10:53	03/03/2023 10:18	R\$ 1.452,66	R\$ 452,59	R\$ 980,07
229783	CTG - 01º SUBSOLO - AUDITÓRIO GOYAZES - Verificar uma luminária do tipo pendente, pois a lâmpada está piscando de form	18/01/2023 12:33	31/01/2023 17:05	R\$ 420,91	R\$ 371,04	R\$ 39,87
229790	CTG - 01º SUBSOLO - Núcleo de Saúde - Instalar espelhos na sala de fisioterapia [151123].	18/01/2023 13:08	22/02/2023 10:38	R\$ 2.070,92	R\$ 1.913,90	R\$ 137,02
229824	VT LUZIANIA - TERREO - Serviços conforme processo administrativo elencados na descrição.	18/01/2023 16:49	31/05/2023 16:13	R\$ 29.761,64	R\$ 23.259,28	R\$ 6.472,36
229869	POSTO AVANÇADO DE PORANGATU - N/A - Emitir ART de manutenção do sistema de gás canalizado, por engenheiro mecânic	19/01/2023 10:54	27/03/2023 16:13	R\$ 1.392,39	R\$ 420,21	R\$ 971,18
230313	FTG - TERREO - Fornecer caçamba para o pessoal da jardinagem colocar seus entulhos (colocar na rua T-29).	05/01/2023 08:18	31/01/2023 14:33	R\$ 484,62	R\$ 484,62	R\$ 10,00
230378	FÓRO DE ITUMBIARA - TERREO - Substituir o motor do portão.	25/01/2023 10:49	31/01/2023 14:28	R\$ 1.928,45	R\$ 1.856,31	R\$ 62,14
230398	VARA DO TRABALHO DE GOIANÉSIA - N/A - Emitir ART de manutenção do sistema de gás canalizado, por engenheiro mecânic	25/01/2023 11:50	22/03/2023 17:02	R\$ 1.389,75	R\$ 398,62	R\$ 971,13
230403	CTG - 01º SUBSOLO - HALL DO AUDITÓRIO GOYAZES - Recorpar pintura do forro do hall do Auditório Goyazes.	25/01/2023 12:14	31/01/2023 14:29	R\$ 1.136,83	R\$ 711,09	R\$ 415,74
230485	FTG - 9º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - Providenciar montagem de rabichos de tomadas em todas as mesas das salas de treinam	26/01/2023 11:01	24/02/2023 00:00	R\$ 3.731,43	R\$ 2.496,80	R\$ 1.224,63
230480	VT DE JATAÍ - TERREO - Recomposição de muro e serviços decorrente do incidente acontecido, conforme mostra fotos em an	26/01/2023 14:15	28/02/2023 14:41	R\$ 9.841,08	R\$ 6.867,89	R\$ 2.963,19
230603	CTG - 1º SUBSOLO - Goteira na lâmpada em frente ao banheiro feminino. (Procurar Karine na Divisão de Saúde)	27/01/2023 09:58	03/01/2024 07:21	R\$ 402,60	R\$ 239,55	R\$ 163,05
230623	VARA DO TRABALHO DE GOIANÉSIA - TERREO - Favor providenciar a emissão de ART de iluminação de emergência da Vara de	27/01/2023 10:57	30/03/2023 15:44	R\$ 1.378,33	R\$ 208,03	R\$ 1.165,30
230680	CTG - 04º SUBSOLO - CASA DE MAQUINAS - Serviços conforme orientações abaixo.	27/01/2023 15:29	28/02/2023 22:29	R\$ 3.195,89	R\$ 3.059,34	R\$ 116,55
230745	CTG - 5º ANDAR - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - Alteração de layout conforme projeto.	30/01/2023 10:48	31/03/2023 16:13	R\$ 16.854,96	R\$ 12.666,27	R\$ 4.158,69
230793	VT DE JATAÍ - TERREO - Substituir placas de piso cerâmico que se soltaram no interior da VT.	30/01/2023 14:05	30/05/2024 15:28	R\$ 1.304,64	R\$ 854,82	R\$ 419,82
230821	CTG - 5º ANDAR - ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA - Vazamento durante a chuva.	30/01/2023 15:14	31/08/2023 13:36	R\$ 10.451,97	R\$ 8.379,52	R\$ 2.042,45
230954	VT DE CALDAS NOVAS - TERREO - ESTACIONAMENTO - Portão não está funcionando corretamente.	31/01/2023 16:39	15/02/2023 08:48	R\$ 131,54	R\$ 34,40	R\$ 92,14
230997	CTG - 2º SUBSOLO - PLENÁRIO CEDRO - Colocar película jateada em frente às portas dos banheiros.	01/02/2023 10:38	06/02/2023 18:12	R\$ 1.294,84	R\$ 1.223,53	R\$ 66,31
231010	IALBA - FACHADA - Fixar pedaço da laje que caiu da fachada do talba.	01/02/2023 11:18	31/05/2023 19:55	R\$ 2.615,03	R\$ 2.247,95	R\$ 360,08
231022	CTG - 1º SUBSOLO - DIVISÃO DE SAÚDE - Infiltração no gesso e vazamento de água.	01/02/2023 11:52	31/08/2023 15:11	R\$ 1.462,29	R\$ 1.086,54	R\$ 330,75
231166	FTG - 9º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - Sala EAD - Fazer a recomposição do forro de gesso próximo ao ar condicionado.	02/02/2023 14:35	23/06/2023 12:41	R\$ 134,32	R\$ 89,41	R\$ 32,91
231544	VT DE MINEIROS - TERREO - Reparar vazamento do telhado (saída da calha) e					

232607	CTG - 4º SUBSOLO - HALL DO ELEVADOR PRIVATIVO DESEMBARGADORES - Demolir parede indicada nas fotos anexas. Proced	17/02/2023 14:09	31/03/2023 11:45	R\$	3.915,97	R\$	3.207,92	R\$	698,05
232688	VT DE GOIATUBA - TERREO - Instalação de concertina.	22/02/2023 13:53	27/03/2023 10:35	R\$	7.486,55	R\$	6.445,64	R\$	1.025,91
232709	FTG - TERREO - ESTACIONAMENTO - Reparar tubulação de água pluvial que se desconectou e alagou o pavimento. Revisar t	22/02/2023 15:25	31/03/2023 16:25	R\$	459,26	R\$	423,53	R\$	33,73
232726	FTG - 02º ANDAR - SAGUÃO DE ENTRADA - Executar enchimento/soleira entre a canaleta de captação de águas pluviais e as p	22/02/2023 16:11	31/08/2023 16:41	R\$	3.350,73	R\$	2.128,00	R\$	1.192,73
232745	CTG - 01º SUBSOLO - HALL DO AUDITORIO GOYAZES - Vazamento em tubulação de água pluvial no banheiro feminino.	22/02/2023 17:35	31/05/2023 17:10	R\$	519,91	R\$	370,21	R\$	139,70
232755	FTG - 9º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - Calafetar fissuras nas muretas sob paredes de placas cimentícias do fechamento das sala	22/02/2023 18:09	25/05/2023 11:00	R\$	2.551,17	R\$	1.938,69	R\$	600,48
233104	VT DE URUACU - TERREO - POR TODA A VT - Substituir entulhos dos portais e alisares da Vara.	27/02/2023 12:09	30/04/2023 14:32	R\$	8.251,39	R\$	4.620,37	R\$	3.626,02
233223	FTG - TERREO - Fornecer caçamba para o retirar entulhos (colocar na rua T-29).	28/02/2023 10:29	07/03/2023 16:31	R\$	969,24	R\$	969,24	-R\$	5,00
233308	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC 2º GRAU - ALTERAÇÃO DE LAYOUT	28/02/2023 17:13	30/04/2023 15:50	R\$	23.356,74	R\$	16.251,16	R\$	7.103,58
233311	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC DIGITAL - ALTERAÇÃO DE LAYOUT	28/02/2023 17:56	31/05/2023 14:45	R\$	38.213,86	R\$	28.087,32	R\$	10.096,54
233384	POSTO AVANÇADO DE IPORÁ - N/A - Emitir ART de manutenção do sistema de gás canalizado, por engenheiro mecânico, con	01/03/2023 13:36	27/03/2023 16:15	R\$	1.665,84	R\$	382,53	R\$	1.282,31
233507	VT DE FORMOSA - TERREO - ESTACIONAMENTO - Instalar portão basculante vertical no lugar do horizontal existente.	02/03/2023 12:22	29/02/2024 08:17	R\$	11.998,00	R\$	10.601,48	R\$	1.396,52
233618	VARA DO TRABALHO DE INHUMAS - TERREO - Unidade está sem fornecimento de energia, o usuário relatou explosão no qua	03/03/2023 12:20	31/03/2023 14:27	R\$	505,01	R\$	395,37	R\$	107,64
233758	FTG - TERREO - GUARITA (ENTRADA DO ESTACIONAMENTO) - Reparar cobertura em acrílico que está parcialmente danificada	06/03/2023 12:57	30/04/2023 16:04	R\$	4.994,58	R\$	4.185,88	R\$	793,70
233862	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC GOIANIA - Instalar filtro.	07/03/2023 10:54	21/06/2023 20:27	R\$	81,07	R\$	57,88	R\$	13,19
233869	CTG - 3º ANDAR - CSIN (COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO) - Fornecimento e instalação de duas persianas.	07/03/2023 11:04	31/03/2023 16:27	R\$	978,34	R\$	284,66	R\$	683,68
233934	CTG - 02º ANDAR - GABINETE DO JUIZ CONVOCADO - SALA DA COPA - Persiana interna da divisória não está funcionando qua	07/03/2023 14:43	22/03/2023 16:56	R\$	54,49	R\$	15,15	R\$	34,34
234082	CTG - 3º ANDAR - BL APOIO - CEJUSC DIGITAL (sala 113) - Remanejar circuitos e luminárias de acordo com o layout apresenta	08/03/2023 16:53	16/08/2023 14:39	R\$	19.946,28	R\$	14.757,05	R\$	5.159,23
234403	FTG - 2º ANDAR - BANHEIRO PNE - LADO T-29 - Lâmpada caiu e o fio está exposto.	13/03/2023 10:13	20/06/2023 17:27	R\$	434,34	R\$	308,74	R\$	120,60
234779	VT DE GOIANÉSIA - TERREO - Serviços diversos, conforme relatório de rotas de fevereiro 2023 e outros serviços listados pela I	15/03/2023 13:53	31/03/2024 16:16	R\$	73.391,72	R\$	38.524,98	R\$	34.866,74
235223	FTG - 9º ANDAR - TERRACO - Colocar grade de apoio para receber parede verde.	20/03/2023 17:06	26/07/2023 09:04	R\$	10.811,12	R\$	9.344,28	R\$	1.446,84
235299	CTG - 3º ANDAR - SALA PROVISÓRIA DA ENGENHARIA - Vedar canto da esquadria externa.	21/03/2023 12:17	17/05/2023 08:19	R\$	2.914,20	R\$	2.444,65	R\$	464,55
235342	CTG - 5º ANDAR - TERRACO DA PRESIDENCIA - Soldar barras do fechamento do guarda corpo soltas/tortas e reparar rachadur	21/03/2023 16:20	05/01/2024 15:49	R\$	426,03	R\$	242,05	R\$	173,98
235456	FORO DE ANAPOLIS - 4º ANDAR - 4º VT - Providenciar a aplicação superficial de manta asfáltica aluminizada de 1mm sobre pr	22/03/2023 14:44	31/07/2023 15:03	R\$	10.537,14	R\$	6.217,90	R\$	4.299,24
235628	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC (ANEXO 1) - Regular porta de vidro que está pegando no chão e tampar buraco no piso vinílico ao la	24/03/2023 09:46	30/04/2023 14:37	R\$	160,10	R\$	45,46	R\$	99,64
235852	VARA DO TRABALHO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - TERREO - Serviços diversos identificados junto a equipe de engenharia.	27/03/2023 15:12	30/06/2023 18:03	R\$	58.120,63	R\$	33.919,97	R\$	24.160,66
235907	FTG - 9º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - Remanejar purificador de água conforme orientações da Ariony. FAVOR, procurar Ariony	28/03/2023 10:32	31/05/2023 17:30	R\$	189,35	R\$	131,02	R\$	48,33
235953	FTG - 6º ANDAR - 4ª VT DE GOIANIA - Fixar persiana que caiu.	28/03/2023 14:26	15/05/2023 16:51	R\$	744,79	R\$	280,69	R\$	449,10
236351	CTG - 2º ANDAR - GABINETE DES. IARA - Alteração de layout, conforme projeto aprovado.	31/03/2023 14:13	25/05/2023 10:36	R\$	315,83	R\$	241,86	R\$	71,97
236674	FTG - 1º ANDAR - ANTIGA SALA DA STI - Fazer os rabichos de elétrica nas estações de trabalho montadas.	05/04/2023 08:40	30/04/2023 16:14	R\$	354,08	R\$	354,08	-R\$	2,00
236675	FTG - 7º ANDAR - SGPE - Fazer identificação de todos os pontos elétricos abaixo do piso, na mesa e no quadro elétrico.	05/04/2023 08:43	31/08/2023 15:43	R\$	541,63	R\$	221,05	R\$	310,58
237358	CTG - 1º SUBSOLO - Sala de togas (turmas) - Providenciar a adequação do layout da unidade, conforme anexo.	17/04/2023 14:50	30/06/2023 11:14	R\$	6.667,02	R\$	6.030,07	R\$	634,95
237616	CTG - 03º ANDAR - BLOCO 01 (APOIO) - CEJUSC 2º GRAU	20/04/2023 11:26	30/08/2023 12:04	R\$	1.547,98	R\$	1.513,42	R\$	26,56
237654	CTG/FTG - VARIOS PAVIMENTOS - VARIOS LOCAIS - Recompôr forros de gesso e realizar pintura nos locais indicados abaixo.	20/04/2023 14:46	26/07/2023 13:37	R\$	3.955,95	R\$	2.609,17	R\$	1.336,78
237655	CTG - 19/29º 3º ANDAR - COPAS LADO T1 / T29 - Providenciar a instalação de cooktop de indução no mesmo padrão dos já ins	20/04/2023 14:49	30/08/2023 11:20	R\$	6.575,01	R\$	4.632,09	R\$	1.906,92
237702	VT DE INHUMAS - Providenciar um eletricitista para verificar o problema de falta de energia do local e caso necessário substitu	24/04/2023 09:20	30/04/2023 11:55	R\$	265,92	R\$	162,89	R\$	101,03
237704	VT DE JATAÍ - Providenciar um eletricitista para verificar o problema de falta de energia do local e caso necessário substituir ev	24/04/2023 09:28	19/05/2023 15:33	R\$	1.373,30	R\$	1.037,28	R\$	334,02
237750	VT DE POSSE - Instalar película fumê em janela na sala de audiências, aproximadamente 12m².	24/04/2023 12:05	21/08/2023 11:50	R\$	524,55	R\$	476,64	R\$	27,91
237886	FTG - TERREO - ENTRADA PRINCIPAL - Fixar guarda corpo que está desaprumado. Procurar Armando para maiores informaçõ	25/04/2023 16:26	26/06/2023 14:31	R\$	917,18	R\$	693,40	R\$	213,78
237889	CTG - 04º SUBSOLO - Colocar em funcionamento o sistema ETAC (Estação de Tratamento de Águas Cinzas).	25/04/2023 16:47	27/07/2023 08:45	R\$	12.919,40	R\$	3.780,62	R\$	9.098,78
237890	FTG/CTG - TODOS - Colocar em funcionamento a central de alarme dos dois edifícios (FTG e CTG).	25/04/2023 16:48	22/09/2023 14:26	R\$	74.063,14	R\$	42.790,83	R\$	31.217,31
237892	FORO DE ANAPOLIS - TODOS - Central de alarme está disparada.	25/04/2023 17:09		R\$	1.377,68	R\$	427,02	R\$	930,66
237893	VARA DO TRABALHO DE GOIÁS - TERREO - ESTACIONAMENTO - Reparar motor do portão do estacionamento.	25/04/2023 17:24	19/07/2023 09:41	R\$	10.856,94	R\$	9.126,03	R\$	1.710,91
237894	VT DE JATAÍ - TERREO - Serviços diversos, conforme visita técnica com os engenheiros Armando e Diego. Em especial troca d	25/04/2023 17:26	30/05/2024 11:57	R\$	76.565,94	R\$	46.019,91	R\$	30.546,03
237936	FTG - 01º ANDAR - DEPOSITO DA STI (ANTIGA SALA STI) - Colocar gradil nas janelas.	26/04/2023 10:45	30/06/2023 11:13	R\$	3.790,75	R\$	2.292,99	R\$	1.495,76
238044	FTG - 7º ANDAR - AMATRA - Alteração de layout conforme projeto aprovado.	27/04/2023 11:29	31/05/2023 15:37	R\$	14.208,10	R\$	11.989,55	R\$	2.198,55
238067	FTG - 01º ANDAR - ANTIGA SALA DA STI - Fazer abertura/fechamento no forro para passagem de cabos lógicos.	27/04/2023 14:07	31/05/2023 16:13	R\$	404,40	R\$	290,71	R\$	111,69
238193	CTG - 02º SUBSOLO - AREA EXTERNA (REGIAO PROXIMA À PAREDE VERDE) - Isolar ruído do compressor utilizado pelo setor o	28/04/2023 16:45	19/07/2023 09:47	R\$	6.701,82	R\$	5.470,08	R\$	1.211,74
238258	FORUM DE ITUMBIAIRA - TERREO - Serviços corretivos de maior porte (ADITIVO).	02/05/2023 10:32		R\$	65.500,01	R\$	44.969,33	R\$	20.510,68
238501	CTG - 03º SUBSOLO - ESCADA DO ESTACIONAMENTO - Porta corta-fogo está sem maçaneta.	04/05/2023 10:44	02/06/2023 14:38	R\$	212,22	R\$	184,77	R\$	17,45
238553	FTG - TERREO - SALA DA SEGURANÇA - Realizar abertura de alçapão para empresa AFEL fazer limpeza química em equipamer	04/05/2023 16:13	19/07/2023 16:49	R\$	505,04	R\$	369,99	R\$	125,05
238759	VT PALMEIRAS DE GOIÁS - Alteração de layout conforme anexo, para criação de vestiário.	08/05/2023 13:56	30/06/2023 11:17	R\$	5.715,84	R\$	4.111,45	R\$	1.584,39
238800	VT DE MINEIROS - N/A - Emitir ART de manutenção do sistema de gás canalizado, por engenheiro mecânico, conforme notifi	08/05/2023 16:30	31/05/2023 15:00	R\$	2.111,41	R\$	430,85	R\$	1.670,56
238982	CTG - 1º SS - Auditório dos Goyazes - rampar soleira da porta de acesso do auditório à sala VIP (vide imagem em anexo).	10/05/2023 11:35	27/07/2023 08:48	R\$	214,64	R\$	155,56	R\$	44,08
239616	FORO DE ITUMBIAIRA - TERREO - Verificar e corrigir central de alarme que está bipando.	18/05/2023 10:54	27/09/2023 16:34	R\$	19.626,42	R\$	8.400,28	R\$	11.206,14
239723	FTG - 8º ANDAR - MANDADOS E TI - Organizar e identificar os circuitos de rede comum e estabilizada, tanto abaixo do piso eli	19/05/2023 12:00	31/08/2023 15:43	R\$	1.554,82	R\$	497,22	R\$	1.047,60
239762	CTG - 02º SUBSOLO - DIVISAO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - SALA DO SIMULADOR DE TIROS - Pintar teto (preto fosco); pa	19/05/2023 15:04	30/06/2023 15:42	R\$	647,84	R\$	255,43	R\$	390,41
240406	CTG - TERREO - PRAÇA - Fornecer e instalar um quadro elétrico e cabeamento para os equipamentos da festa junina do dia 2	29/05/2023 13:36	26/06/2023 15:35	R\$	23.023,58	R\$	19.980,10	R\$	3.035,48
240407	CTG - 02º ANDAR - GABINETE DA DESEMBARGADORA WANDA - Reparar vazamento em tubulação de incêndio.	29/05/2023 13:38	26/07/2023 09:00	R\$	1.569,64	R\$	1.053,70	R\$	513,94
240408	CTG - 02º ANDAR - GABINETE DA DESEMBARGADORA WANDA - Corrigir trinca em parede.	29/05/2023 13:41	04/07/2023 10:44	R\$	1.081,68	R\$	753,64	R\$	308,04
240534	VT SAO LUIS DE MONTES BELOS - N/A - Emitir ART de manutenção do sistema de gás canalizado, por engenheiro mecânico, c	30/05/2023 12:29	30/06/2023 14:12	R\$	2.304,72	R\$	609,89	R\$	1.684,83
240661	FTG - 3º ANDAR - ATERMAÇÃO - Remoção e instalação de película de controle solar.	31/05/2023 11:38	21/07/2023 14:25	R\$	5.185,22	R\$	4.586,94	R\$	578,28
241169	FTG - TERREO - ESTACIONAMENTO	06/06/2023 10:59	25/08/2023 13:15	R\$	15.797,52	R\$	10.184,92	R\$	5.577,60
241231	FTG - 01º ANDAR - ANTIGA SALA DA STI	06/06/2023 16:06	21/06/2023 20:44	R\$	81,06	R\$	50,28	R\$	25,78
241658	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC (SALA 15 ANEXO 3) - Regular abertura da janela de vidro.	14/06/2023 11:32	23/06/2023 10:59	R\$	48,24	R\$	13,72	R\$	32,52
241809	FORO DE APARECIDA - PRÉDIO TODO GERAL - Realizar a troca do piso (instalar porcelanato padrão aprovado pela DEC) de tor	16/06/2023 07:07	30/01/2024 10:32	R\$	83.379,25	R\$	55.818,75	R\$	27.520,50
241810	CTG - 3º ANDAR - ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - Vazamento no sprinkler no teto do novo estúdio de gravação.	16/06/2023 07:19	20/09/2023 14:49	R\$	2.782,89	R\$	1.392,87	R\$	1.388,02
242065	VT DE CERES - Trocar a caixa d'água.	20/06/2023 10:37	28/07/2023 08:48	R\$	7.007,37	R\$	3.870,72	R\$	3.111,65
242364	CTG - 01º SUBSOLO - Sala de Sessões Areioira - Regular porta de vidro do corredor interno	22/06/2023 14:58	16/08/2023 12:15	R\$	295,11	R\$	141,40	R\$	143,71
242383	FTG - COBERTURA - BARRILETE	22/06/2023 16:48	30/08/2023 12:06	R\$	40.095,87	R\$	36.549,41	R\$	3.516,46
242386	VT DE INHUMAS - TÊRREO - ENTRADA DA VT - Substituir a mola da porta de vidro da entrada principal (já foi substituída de ur	23/06/2023 07:06	30/06/2023 18:02	R\$	1.390,66	R\$	1.218,19	R\$	162,47
242486	FTG - 8º andar - STI atendimento - Instalar película jateada nas janelas dos técnicos em rede.	23/06/2023 15:35	30/06/2023 14:12	R\$	1.723,98	R\$	1.629,04	R\$	92,94
242627	VT DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - Verificar o problema de falta de energia no local.	27/06/2023 09:01	31/07/2023 18:58	R\$	4.389,22	R\$	3.050,20	R\$	1.324,02
243141	FTG - 3º ANDAR - PROTOCOLO - Realizar a separação e identificação dos circuitos, nas duas pontas.	03/07/2023 08:24	31/08/2023 15:44	R\$	541,63	R\$	221,05	R\$	310,58
243209	CTG - 3º andar - Gabinete Desor. Platon - Reinstalar cortina caída.	03/07/2023 14:10	17/07/2023 10:10	R\$	393,82	R\$	153,19	R\$	240,63
243296	FTG - SUBSOLO - GARAGEM - Fornecer caçamba de entulho para limpeza dos restos de materiais depositados no subsolo do	04/07/2023 11:34	19/07/2023 09:48	R\$	495,83	R\$	488,27	-R\$	2,44
243505	VT DE GOIATUBA - TÊRREO - SECRETARIA E CORREDOR - SUBSTITUIR PORTA DE MADEIRA, NO FINAL DO CORREDOR, POR ALL	06/07/2023 10:48		R\$	3.949,67	R\$	3.193,86	R\$	725,81
243560	FTG - TERREO - ESTACIONAMENTO	06/07/2023 15:01	31/08/2023 13:44	R\$	1.761,62	R\$	1.116,15	R\$	620,47
243624	CTG - 5º ANDAR - PRESIDENCIA - A roldana da porta de vidro de correr quebrou, que fica na entrada da Presidência.	07/07/2023 12:17	13/07/2023 13:52	R\$	264,69	R\$	75,22	R\$	184,47
243885	CTG - 2º SS - ASIUSTEGO - Colocar em funcionamento os chuveiros que ficam no VESTIÁRIO ao lado do refeitório da ASIUSTE	11/07/2023 15:05	25/08/2023 10:50	R\$	3.004,54	R\$	2.373,78	R\$	616,76
243900	FTG - TERREO - ESTACIONAMENTO - Reafixar taxões na entrada da edificação, como também bate-rodas das vagas de garag	11/07/2023 17:28	21/08/2023 15:40	R\$	8.823,69	R\$	5.850,53	R\$	2.933,16
244047	FTG - 2º andar - CEJUSC (Secretaria lado T1) - Instalar insulfim na janela da fachada atrás da mesa da Lourdes.	13/07/2023 14:19	31/07/2023 14:31	R\$	1.155,80	R\$	1.050,24	R\$	95,56
244140	CTG - 3ºSUBSOLO - ESTACIONAMENTO - Verificar/consertar o acionamento do portão de entrada do 3º SS.	14/07/2023 12:51	09/08/2023 15:17	R\$	324,70	R\$	85,84	R\$	228,86
244205	FTG - 6º ANDAR - ANDAR INTERIO - Organizar e identificar os circuitos de rede comum e estabilizada. A identificação deve se	17/07/2023 10:20	31/10/2023 14:29	R\$					

248530	VT DE CATALAO - FACHADA FRONTAL	05/09/2023 13:53	18/10/2023 10:26	R\$	33,58	R\$	21,21	R\$	12,37
248642	FTG - SUBSOLO - ESTACIONAMENTO	06/09/2023 11:19	11/10/2023 14:48	R\$	420,63	R\$	371,20	R\$	44,43
248644	FTG/CTG - TODOS	06/09/2023 11:25		R\$	73.006,54	R\$	53.466,70	R\$	19.539,84
249182	CTG - PRACA	13/09/2023 10:18	31/10/2023 15:15	R\$	991,72	R\$	308,34	R\$	683,38
249292	FTG/CTG - COBERTURA	13/09/2023 15:53	30/10/2023 09:39	R\$	27.470,21	R\$	18.964,71	R\$	8.445,50
249297	FTG - 06º ANDAR - LADO T51 - CORREDOR DE CIRCULACAO	13/09/2023 15:55	10/10/2023 17:28	R\$	218,26	R\$	111,67	R\$	101,59
249448	CTG - 01º SUBSOLO - SALA DE SÊSSES CEDRO	14/09/2023 16:48	22/09/2023 11:50	R\$	136,10	R\$	36,68	R\$	94,42
249640	FTG/CTG - TODOS OS PAVIMENTOS	15/09/2023 16:27	10/10/2023 16:35	R\$	701,33	R\$	417,01	R\$	279,32
250066	FTG - 6º ANDAR - 4ª VT DE GOIANIA - SALA DE APOIO	19/09/2023 14:37	29/09/2023 16:20	R\$	407,44	R\$	364,90	R\$	22,54
250088	FTG - 5º ANDAR - ANDAR INTEIRO	19/09/2023 15:52	17/10/2023 16:13	R\$	1.554,82	R\$	497,22	R\$	1.047,60
250777	FTG/CTG - GERAL	25/09/2023 16:44	29/12/2023 09:02	R\$	916,94	R\$	599,22	R\$	317,72
251154	FTG - 6º ANDAR - ANDAR INTEIRO	28/09/2023 16:14	28/02/2024 08:10	R\$	1.240,23	R\$	1.088,87	R\$	151,36
251203	FTG - 1º ANDAR - BIBLIOTECA	29/09/2023 10:58	11/10/2023 12:20	R\$	1.190,35	R\$	1.071,64	R\$	103,71
251499	FTG - TERREO - COPA CENTRAL (COPA DA ZELADORIA)	03/10/2023 10:24	30/04/2024 14:23	R\$	5.428,43	R\$	4.430,54	R\$	997,89
251660	IALBA - SUBSOLO - ALMOXARIFADO	04/10/2023 11:17	18/06/2024 15:39	R\$	1.254,65	R\$	1.212,92	R\$	41,72
251689	VT DE LUZIANIA - TERREO - VARIOS LOCAIS	04/10/2023 13:29	29/02/2024 15:48	R\$	63.995,32	R\$	38.523,14	R\$	25.472,18
251797	FTG/CTG - DIVERSOS PAVIMENTOS - DIVERSOS LOCAIS	05/10/2023 10:45		R\$	862,66	R\$	735,49	R\$	127,17
251799	FTG/CTG - DIVERSOS PAVIMENTOS - DIVERSOS LOCAIS	05/10/2023 10:49		R\$	709,97	R\$	424,13	R\$	285,83
251802	FTG/CTG - DIVERSOS PAVIMENTOS - DIVERSOS LOCAIS	05/10/2023 10:54	12/02/2024 16:37	R\$	1.831,83	R\$	1.073,32	R\$	758,51
251814	FTG/CTG - TERREO/01º SUBSOLO - ESCADARIA DA PRACA (LADO T1)/HALL DOS PLENARIOS	05/10/2023 11:25	30/11/2023 17:08	R\$	9.914,43	R\$	9.094,34	R\$	820,09
251817	FTG - TERREO/SUBSOLO - CALCADA FRONTAL/ESTACIONAMENTO/SALA DOS MOTOVENTILADORES	05/10/2023 11:35	16/01/2024 13:55	R\$	602,94	R\$	500,52	R\$	102,42
251853	FTG - SUBSOLO - ESTACIONAMENTO	05/10/2023 14:23	20/10/2023 08:44	R\$	280,39	R\$	247,47	R\$	32,92
252115	FTG - 1º ANDAR - BIBLIOTECA	09/10/2023 11:11	31/12/2023 14:46	R\$	146.503,55	R\$	109.139,78	R\$	37.363,77
252346	CTG - 3º ANDAR - GABINETE DO DESEMBARGADOR MARCELO PEDRA	10/10/2023 16:57	13/11/2023 10:20	R\$	420,97	R\$	401,05	R\$	19,92
252433	VT DE CATALAO - TERREO	11/10/2023 13:39	31/05/2024 09:48	R\$	2.229,05	R\$	522,77	R\$	1.706,28
252558	FTG - SUBSOLO - AREA COMUM - SALA DE NOBREAK	16/10/2023 11:04	29/02/2024 16:36	R\$	7.546,69	R\$	7.546,69	R\$	-
252620	FTG - TERREO - DIVISAO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - SALA DE RESERVA DE ARMAS	16/10/2023 14:09	30/05/2024 14:12	R\$	5.110,53	R\$	4.651,35	R\$	459,18
252626	CTG - 01º SUBSOLO - HALL DOS PLENARIOS	16/10/2023 14:38	08/01/2024 10:17	R\$	74,70	R\$	55,54	R\$	19,16
252831	CTG - 01º SUBSOLO - BLOCO APOIO - DIVISAO DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONSULTORIO 03	17/10/2023 15:28	30/11/2023 14:33	R\$	3.225,81	R\$	2.161,30	R\$	1.064,51
252929	FTG/CTG - VARIOS PAVIMENTOS - VARIOS LOCAIS	18/10/2023 11:46	23/11/2023 16:20	R\$	261,57	R\$	242,73	R\$	18,84
252962	FTG/CTG - TODOS OS PAVIMENTOS - CAIXA DE ESCADA	18/10/2023 13:28		R\$	3.356,07	R\$	2.007,74	R\$	1.348,33
252964	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC - ANEXO 03	18/10/2023 13:30	31/10/2023 11:34	R\$	300,41	R\$	85,29	R\$	215,12
252997	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC - ANEXO 03	18/10/2023 15:14	30/04/2024 14:14	R\$	151,21	R\$	147,23	R\$	3,98
253042	CTG - 2º SUBSOLO - SALA DE SEGURANCA	19/10/2023 09:30		R\$	120,96	R\$	73,83	R\$	47,13
253124	VT DE FORMOSA - TERREO - VARIOS LOCAIS	19/10/2023 15:31	31/03/2024 16:05	R\$	24.371,06	R\$	17.097,77	R\$	7.273,29
253819	CTG - 4º SUBSOLO - AREA COMUM	30/10/2023 09:50	12/01/2024 10:46	R\$	144,22	R\$	105,71	R\$	38,51
253874	VT DE CATALAO - TERREO	30/10/2023 10:17	30/11/2023 11:31	R\$	238,35	R\$	94,63	R\$	143,72
254060	VT DE GOIANESIA - TERREO	31/10/2023 14:11	28/12/2023 12:07	R\$	397,18	R\$	215,10	R\$	182,08
254078	FTG - SUBSOLO - SALA AO LADO DA SUBESTACAO	31/10/2023 16:20	15/12/2023 16:32	R\$	994,25	R\$	679,15	R\$	315,10
254150	CTG - 2º ANDAR - BLOCO APOIO - COORDENADORIA DE APOIO A 3ª TURMA - SALA DA CHEFIA - BANHEIRO	06/11/2023 09:38	09/01/2024 14:22	R\$	360,10	R\$	243,41	R\$	116,69
254251	FTG - TERREO - BANHEIRO PUBLICO PNE	06/11/2023 14:29	28/12/2023 15:54	R\$	73,07	R\$	61,27	R\$	11,81
254532	CTG - 01º SUBSOLO - VARIOS LOCAIS	08/11/2023 16:24	05/01/2024 13:37	R\$	1.396,48	R\$	971,18	R\$	425,30
254562	CTG - 2º PAVIMENTO - HALL DOS ELEVADORES	09/11/2023 09:44	10/01/2024 15:02	R\$	32,64	R\$	28,65	R\$	3,98
254693	VT DE GOIATUBA - TERREO - ESTACIONAMENTO	10/11/2023 09:59		R\$	1.928,45	R\$	1.856,31	R\$	72,14
255217	FTG - TERREO - ENTRADA ESTACIONAMENTO	17/11/2023 11:44	22/01/2024 10:32	R\$	39.142,91	R\$	838,74	R\$	38.304,17
255352	FORO DE ITUMBIARA - COBERTURA / RESERVATORIO DE AGUA	20/11/2023 10:33	15/12/2023 12:07	R\$	844,52	R\$	562,76	R\$	281,77
255400	VT QUIRINOPOLIS - TERREO	20/11/2023 11:58	30/11/2023 16:46	R\$	284,12	R\$	192,85	R\$	91,27
255412	CTG - 1º SUBSOLO - SETOR ODONTOLOGICO	20/11/2023 12:47	14/12/2023 14:14	R\$	524,93	R\$	507,72	R\$	17,21
255621	FTG - BARRILETE - BARRILETE DAS BOMBAS DE INCENDIO	22/11/2023 08:07		R\$	52.668,35	R\$	46.026,75	R\$	6.641,60
255693	CTG - 1º SUBSOLO - SETOR MEDICO	22/11/2023 11:46	05/01/2024 13:34	R\$	2.523,81	R\$	1.844,94	R\$	678,86
255704	FTG - 1º ANDAR - ENTRADA DO FTG PELA PRACA	22/11/2023 12:18	24/01/2024 13:16	R\$	1.656,85	R\$	1.314,97	R\$	341,88
255712	FTG - 1º ANDAR - ESPACO CONGADAS	22/11/2023 12:29		R\$	3.904,94	R\$	2.848,74	R\$	1.056,20
255716	FTG - 9º ANDAR - SALA DE AULA - LADO T29	22/11/2023 12:33	30/01/2024 15:38	R\$	37.558,85	R\$	35.890,68	R\$	1.668,17
255731	FTG - TERREO - DEPOSITO (EM FRENTE À LANCHONETE)	22/11/2023 13:51	07/03/2024 09:18	R\$	257,62	R\$	157,74	R\$	99,88
255743	FTG - TERREO	22/11/2023 14:46	30/11/2023 07:45	R\$	496,69	R\$	488,56	R\$	8,13
255860	FTG - 9º ANDAR - ESCOLA JUDICIAL - SALA DE FORMACAO DE SERVIDORES - CORREDOR	23/11/2023 12:21		R\$	942,28	R\$	431,61	R\$	510,67
256710	VT DE CALDAS NOVAS - TERREO - ESTACIONAMENTO	27/11/2023 11:05	30/11/2023 11:40	R\$	166,35	R\$	43,52	R\$	122,82
256795	FTG/CTG - TODOS OS PAVIMENTOS	27/11/2023 11:23	30/11/2023 11:45	R\$	8.676,44	R\$	8.315,44	R\$	361,00
256632	CTG - 1º ANDAR - GABINETE DESEMBARGADOR DANIEL	30/11/2023 12:42	29/12/2023 14:16	R\$	12.840,61	R\$	10.049,14	R\$	2.791,47
256644	CTG - TERREO - ENTRADA DO EDIFICIO (T-52)	30/11/2023 14:40	24/01/2024 16:17	R\$	3.331,95	R\$	2.346,81	R\$	985,14
257004	CTG - 3º ANDAR - PASSARELA (ENTRE OS BLOCOS)	06/12/2023 07:22	28/12/2023 12:22	R\$	724,15	R\$	470,98	R\$	253,17
257278	FTG - 6º ANDAR - 3ª VT DE GOIANIA - SALA DE APOIO	07/12/2023 14:57	20/12/2023 08:13	R\$	429,80	R\$	387,58	R\$	42,21
257507	FTG - TODOS OS PAVIMENTOS	11/12/2023 10:37	29/02/2024 09:41	R\$	8.951,41	R\$	7.701,61	R\$	1.249,80
257677	FTG - 1º ANDAR - BIBLIOTECA	12/12/2023 14:39	20/02/2024 13:51	R\$	430,78	R\$	341,81	R\$	88,97
257859	CTG - TERREO - BLOCO GABINETES - CENTRO DE MEMORIA	14/12/2023 10:38	23/01/2024 15:12	R\$	275,99	R\$	135,30	R\$	140,70
257869	FORO DE ANAPOLIS - TERRENO	14/12/2023 11:33		R\$	50.734,65	R\$	43.390,22	R\$	7.344,44
257870	FTG - TERREO	14/12/2023 11:45	22/12/2023 16:08	R\$	496,69	R\$	488,56	R\$	8,13
258153	CTG - 2º SUBSOLO - FOYER / SALA DAS AUTORIDADES	18/12/2023 16:29	29/12/2023 00:42	R\$	109,94	R\$	24,87	R\$	85,07
258311	CTG - 1º ANDAR - SALA DE SEGURANCA (ENTRADA DA SALA)	21/12/2023 15:48	30/05/2024 09:40	R\$	549,88	R\$	506,29	R\$	43,58
258344	CTG - 1º SUBSOLO - HALL DOS PLENARIOS - BANHEIRO FEMININO	27/12/2023 13:09	25/01/2024 07:31	R\$	229,97	R\$	154,57	R\$	75,40
258367	CTG - 01º SUBSOLO - BLOCO APOIO - DIVISAO DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONSULTORIO 03	28/12/2023 15:47	30/01/2024 09:29	R\$	132,93	R\$	89,35	R\$	43,58
258389	FTG - TERREO - ENTRADA DO EDIFICIO	02/01/2024 11:30	31/05/2024 14:10	R\$	14.116,77	R\$	10.187,50	R\$	3.929,26
258973	VT DE VALPARAISO - TERREO - SALA TECNICA	11/01/2024 11:36		R\$	1.312,17	R\$	940,42	R\$	371,75
258995	FTG - TERREO - AREA EXTERNA	11/01/2024 13:52	30/04/2024 14:25	R\$	1.021,98	R\$	379,36	R\$	642,62
259023	CTG - COBERTURA	11/01/2024 15:41		R\$	803,14	R\$	555,66	R\$	247,48
259229	CTG - TERREO - PRACA	15/01/2024 14:25		R\$	23.746,54	R\$	19.871,09	R\$	3.875,45
259394	FTG - 4º ANDAR - ANDAR INTEIRO	16/01/2024 17:03	18/03/2024 15:48	R\$	454,00	R\$	454,00	R\$	-
259432	FORO DE ITUMBIARA - TERREO	17/01/2024 10:20	21/08/2024 14:41	R\$	405,78	R\$	109,17	R\$	296,60
259433	CTG - 2º SUBSOLO - FOYER	17/01/2024 10:21	29/02/2024 15:49	R\$	1.393,43	R\$	488,67	R\$	904,76
259435	VT DE PORANGATU - TERREO - AREA EXTERNA	17/01/2024 10:25	31/01/2024 17:05	R\$	3.631,67	R\$	2.360,69	R\$	1.270,99
259690	VT VALPARAISO - TERREO	19/01/2024 10:33	31/07/2024 13:57	R\$	112.476,81	R\$	74.717,68	R\$	37.759,13
260005	FORO DE APARECIDA DE GOIANIA - TERREO - BANHEIROS E ESTACIONAMENTO	23/01/2024 09:48	19/04/2024 15:40	R\$	8.634,18	R\$	7.336,06	R\$	1.298,12
260403	CTG - 01º SUBSOLO - BLOCO APOIO - DIVISAO DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONSULTORIO 03	25/01/2024 15:25	23/02/2024 16:37	R\$	118,95	R\$	84,19	R\$	34,76
260624	CTG - AUDITORIO DOS GOYAZES - 1º SUBSOLO	29/01/2024 09:49	16/08/2024 13:21	R\$	2.224,70	R\$	1.959,17	R\$	265,53
260786	FTG - TERREO - CENTRAL DE GÁS	30/01/2024 10:17	27/03/2024 07:13	R\$	936,62	R\$	24,13	R\$	912,49
260787	FTG/CTG - SUBSOLOS (TODOS) - ESTACIONAMENTOS	30/01/2024 10:22	31/07/2024 13:58	R\$	28.235,26	R\$	21.421,19	R\$	6.814,07
260825	FTG - 2º ANDAR - CEJUSC - VARIOS LOCAIS	30/01/2024 11:49	21/03/2024 14:13	R\$	53,87	R\$	28,98	R\$	24,88
261029	CTG - 2º SUBSOLO - SALA DE MANUTENCAO	31/01/2024 16:20	30/04/2024 16:26	R\$	7.048,44	R\$	4.465,82	R\$	2.582,62
261218	FTG - 4º ANDAR - 15ª VT DE GOIANIA - COPA	02/02/2024 09:39	12/02/2024 16:40	R\$	21,62	R\$	13,30	R\$	8,32
261439	VT DE URUACU - TERREO - SALA TECNICA	05/02/2024 13:07	23/02/2024 17:00	R\$	2.020,93	R\$	1.603,33	R\$	417,60
261628	FTG - 4º ANDAR - 15ª VT DE GOIANIA - SECRETARIA	06/02/2024 13:37	15/02/2024 07:32	R\$	21,62	R\$	13,30	R\$	8,32
262008	CTG - 4º ANDAR - SECRETARIA GERAL DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA - SALA DO DIRETOR	09/02/2024 14:24	13/05/2024 11:42	R\$	282,68	R\$	256,41	R\$	26,27
262221	FORO DE ITUMBIARA - TERREO	15/02/2024 13:09	08/03/2024 09:50	R\$	1.336,45	R\$	784,30	R\$	552,14
262349	CTG - TERREO - CENTRO DE MEMORIA - BANHEIRO	16/02/2024 13:46	30/05/2024 15:45	R\$	1.340,96	R\$	971,52	R\$	369,45
262613	VT GOIAS - TERREO	20/02/2024 14:33	28/03/2024 11:10	R\$	1.187,08	R\$			

263856	FTG - 8º ANDAR - DIRETORIA GERAL - SALA DE APOIO	04/03/2024 14:59	25/03/2024 16:35	R\$	498,96	R\$	449,95	R\$	49,01
264230	POSTO AVANÇADO PIRES DO RIO - COBERTURA	07/03/2024 10:34	31/03/2024 16:37	R\$	1.067,55	R\$	529,42	R\$	538,13
264231	VT LUZIANIA - TERREO - AREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO PUBLICO	07/03/2024 10:36	30/06/2024 17:43	R\$	45.013,03	R\$	29.197,03	R\$	15.816,00
265463	FTG - 7º ANDAR - AMATRA	21/03/2024 08:51	28/03/2024 11:32	R\$	2.951,17	R\$	246,56	R\$	2.704,60
267293	CTG - 01º ANDAR - BLOCO GABINETES - GABINETE DESEMBARGADOR ELVECIO	26/03/2024 09:39	26/04/2024 11:55	R\$	739,46	R\$	707,07	R\$	32,39
265876	FTG - SUBSOLO - GARAGEM	26/03/2024 10:21		R\$	5.710,21	R\$	2.710,35	R\$	2.999,86
265931	FORO DE APARECIDA DE GOIANIA - TERREO	26/03/2024 14:18	30/05/2024 08:15	R\$	1.370,62	R\$	919,02	R\$	451,60
265934	FORO DE ANAPOLIS - TERREO - AREA EXTERNA - ENTRADA ESTACIONAMENTO	26/03/2024 14:32	28/06/2024 17:01	R\$	28.576,97	R\$	14.956,69	R\$	13.620,27
266362	CTG - 4º ANDAR - BLOCO GABINETES - DIVISAO DE GESTAO DE MAGISTRADOS	03/04/2024 14:46	31/05/2024 14:37	R\$	5.715,60	R\$	389,51	R\$	5.326,08
266496	POSTO AVANÇADO DE POSSE	04/04/2024 16:06	30/05/2024 12:06	R\$	3.004,08	R\$	1.753,28	R\$	1.250,80
267058	IALBA - SUBSOLO - ALMOXARIFADO	11/04/2024 10:27	30/04/2024 14:24	R\$	287,00	R\$	216,84	R\$	70,16
267427	FTG - 3º ANDAR - LADO T1 - BANHEIRO FEMININO PUBLICO	16/04/2024 09:39	30/05/2024 14:35	R\$	986,19	R\$	860,81	R\$	125,38
268297	FORO DE ANAPOLIS	24/04/2024 14:20		R\$	2.201,03	R\$	203,12	R\$	1.997,92
268299	FORO DE RIO VERDE	24/04/2024 14:20		R\$	2.842,55	R\$	724,81	R\$	2.117,74
268300	VT DE LUZIANIA	24/04/2024 14:20		R\$	2.605,21	R\$	570,03	R\$	2.035,19
268485	FTG - 1º ANDAR - AUDITORIO VILLA BOA	25/04/2024 15:24	30/04/2024 16:39	R\$	27,49	R\$	6,22	R\$	21,27
268490	CTG - 1º SUBSOLO - AUDITORIO GOYAZES	25/04/2024 15:24	31/05/2024 14:09	R\$	151,17	R\$	34,20	R\$	116,97
268580	FTG - TERREO	26/04/2024 17:19	30/04/2024 14:26	R\$	484,62	R\$	484,62	R\$	-
268664	CTG - 03º SUBSOLO - SALA MOTORISTAS	29/04/2024 12:02		R\$	1.432,48	R\$	740,22	R\$	692,26
268985	FORO DE APARECIDA DE GOIANIA - TERREO - 01º VT	02/05/2024 16:53	14/05/2024 07:27	R\$	155,03	R\$	104,35	R\$	50,69
269038	FTG - TERREO - ENTRADA FTG	03/05/2024 10:47	08/05/2024 08:09	R\$	798,37	R\$	383,71	R\$	414,66
269638	CTG - 4º SUBSOLO - ETAC	10/05/2024 16:02	28/06/2024 11:47	R\$	3.813,02	R\$	3.813,02	R\$	-
269771	FTG - 1º ANDAR - AUDITORIO VILLA BOA / CTG - 01º SUBSOLO - HALL DO AUDITORIO GOYAZES	13/05/2024 16:35	31/05/2024 14:07	R\$	727,39	R\$	161,66	R\$	565,73
271043	CTG - 5º ANDAR - AUDITORIO DA PRESIDENCIA	29/05/2024 12:03	31/05/2024 14:10	R\$	321,73	R\$	71,50	R\$	250,23
271176	FTG - COBERTURA - BARRILETE - RESERVATORIO	03/06/2024 15:51		R\$	7.594,04	R\$	6.121,64	R\$	1.472,40
274471	FTG/CTG - VARIOS PAVIMENTOS - VARIOS LOCAIS	11/06/2024 10:44	25/06/2024 14:03	R\$	18.973,84	R\$	11.793,25	R\$	7.180,59
271921	FTG - TERREO - ESTACIONAMENTO	11/06/2024 11:14	21/06/2024 13:40	R\$	484,62	R\$	484,62	R\$	-
272222	FTG - 8º ANDAR - DIRETORIA GERAL	13/06/2024 14:45		R\$	1.282,46	R\$	1.184,63	R\$	97,83
272229	FTG - 7º ANDAR - LADO T29 - BANHEIRO MASCULINO PUBLICO	13/06/2024 15:08		R\$	5.061,67	R\$	4.510,70	R\$	550,97
272346	CTG - 4º SUBSOLO - CASA DE BOMBAS	14/06/2024 17:04	19/06/2024 13:20	R\$	411,20	R\$	227,67	R\$	183,53
273008	VT SAO LUIS DE MONTES BELOS - TERREO - SALA DE ESPERA	24/06/2024 11:26		R\$	1.640,68	R\$	973,04	R\$	667,64
273287	VT GOIAS - TERRENO	26/06/2024 11:39		R\$	55.620,54	R\$	47.754,26	R\$	7.866,28
273507	VT DE GOIANESIA - TERREO	28/06/2024 10:50	30/06/2024 14:47	R\$	986,67	R\$	673,75	R\$	312,92
273623	VT DE INHUMAS - ESTACIONAMENTO - PORTAO ELETRONICO	01/07/2024 09:39		R\$	1.907,88	R\$	1.243,39	R\$	664,48
273977	VARA DO TRABALHO DE POSSE - TERREO - POR TODA A VT	03/07/2024 15:56	31/07/2024 13:57	R\$	127.488,23	R\$	90.167,72	R\$	37.320,51
274618	FORO DE ANAPOLIS - NOVA SEDE	12/07/2024 16:30		R\$	3.935,50	R\$	2.852,39	R\$	1.083,11
275429	CTG - 3º SUBSOLO - ESTACIONAMENTO	24/07/2024 14:48	31/07/2024 13:56	R\$	228,30	R\$	122,87	R\$	105,43
276230	FTG - TERREO	02/08/2024 14:21	09/08/2024 15:16	R\$	470,00	R\$	470,00	R\$	-
276257	CTG - 01º SUBSOLO - HALL DO AUDITORIO GOYAZES / COPA DA TI	02/08/2024 16:56		R\$	55,95	R\$	12,44	R\$	43,52
276410	CTG - 04º SUBSOLO - ETAC	06/08/2024 10:08		R\$	2.806,30	R\$	2.491,16	R\$	315,14
276687	CTG - TERREO - AREA EXTERNA	08/08/2024 16:45		R\$	4.151,36	R\$	3.850,66	R\$	300,70
277458	FORO DE ITUMBIARA - TERREO	21/08/2024 14:30		R\$	229,20	R\$	144,14	R\$	85,06
